

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

31 октября 2025 года

г. Петропавловск-Камчатский

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 1.3.4. плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ от 27.12.2024 № 66-КСП.

Отчет составлен на основании акта о результатах проведения контрольного мероприятия от 30.09.2025 № 01-06/16-1.3.4.

2. Цель контрольного мероприятия: - осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа².

3. Предмет контрольного мероприятия: - деятельность муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»³ по целевому и эффективному использованию средств бюджета городского округа, выделенных на основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» Подпрограммы 3 «Организация и безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»⁴.

4. Проверяемый период: 2024 год (иные периоды в случае необходимости).

5. Объект контроля:

Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»⁵. Юридический адрес: 683001, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 1; ОГРН 1114101001057, свидетельство от 03.03.2011, ИНН 4101143436.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 18.08.2025 по 30.09.2025.

7. Наличие пояснений и/или замечаний, поступивших от объекта контроля на акт о результатах проведения контрольного мероприятия:

- пояснения и замечания от МКУ «САД» от 09.10.2025 № 5314/25 (Заключение КСП от 14.10.2025 № 01-КСП-01/560-Д/25).

8. Объем проверенных средств и/или имущества: 138 755 255,02 рублей.

9. Результаты контрольного мероприятия:

МКУ «Служба автомобильных дорог» является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. Тип учреждения – казенное.

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – городской округ, ПКГО.

³ Далее – Учреждение, МКУ «САД».

⁴ Далее – мероприятие, основное мероприятие.

⁵ Далее – МКУ «САД», МКУ «Служба автомобильных дорог», Учреждение, Заказчик, Муниципальный заказчик, Абонент.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, в лице Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа⁶.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевой и иные счета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

Целями деятельности Учреждения является обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Петропавловск-Камчатского городского округа.

Предметом деятельности Учреждения является организация выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах Петропавловск-Камчатского городского округа, а также осуществление контроля в сфере регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в пределах компетенции, установленной муниципальными контрактами.

Все имущество Учреждения находится в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления.

1. Анализ соблюдения требований положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок учреждением в рамках реализации мероприятия

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»⁷ установлен ряд требований, которые должны соблюдать Заказчики при организации осуществления закупок.

Так, частью 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ установлено, что заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом, создание специального структурного подразделения не является обязательным).

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок⁸.

Типовое положение (регламент) о контрактной службе утверждено приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового

⁶ Далее – Управление, УДХТБ.

⁷ Далее – Закон № 44-ФЗ, Федеральный закон № 44-ФЗ.

⁸ Часть 3 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

положения (регламента) о контрактной службе» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 № 60465)⁹.

Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок¹⁰.

В ходе анализа установлено, что совокупный годовой объем закупок Учреждения превышает сто миллионов рублей, в 2024 году – 1 568 460 449,81 рублей.

В целях соблюдения требований части 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в Учреждении создана контрактная служба и утверждено Положение (регламент) о контрактной службе от 20.08.2025, которое соответствует требованиям Приказа № 158н.

Согласно предоставленному Учреждением штатному расписанию от 01.12.2023, от 24.12.2024, контрактная служба Учреждения включает в себя руководителя контрактной службы, двух специалистов контрактной службы I категории, специалиста контрактной службы II категории.

По результатам анализа должностных инструкций руководителя контрактной службы, двух специалистов контрактной службы I категории, специалиста контрактной службы II категории Учреждения установлено, что должностные инструкции соответствуют части 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

Сотрудники контрактной службы Учреждения имеют высшее и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок в соответствии с требованиями части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

Постановлением № 1279¹¹ утверждено Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и требованиях к форме планов-графиков закупок¹².

План-график утверждается в течение 10 рабочих дней заказчиками, указанными в подпунктах «а»¹³ и «е»¹⁴ пункта 2 Постановления № 1279, - со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации¹⁵.

Согласно представленному Учреждением уведомлению о бюджетных назначениях на 2024 финансовый год и плановый период 2025-2026 годов от 27.11.2023 № 27 лимиты бюджетных обязательств на 2024 год доведены до Учреждения 27.11.2023 в размере 1 729 861 856,76 рублей.

⁹ Далее – Приказ № 158н.

¹⁰ Часть 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

¹¹ Здесь и далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации».

¹² Приложение № 1 к Постановлению № 1279.

¹³ Государственные заказчики, действующие от имени Российской Федерации.

¹⁴ Государственные заказчики, действующие от имени субъекта Российской Федерации, или муниципальные заказчики.

¹⁵ Пункт 12 Постановления № 1279.

Учреждением План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 года¹⁶ (версия 0) утвержден 11.12.2023 и размещен 11.12.2023, что соответствует требованиям части 6 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 Постановления № 1279.

В течение 2024 года в План-график 77 раз вносились изменения.

В целях исполнения основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» Учреждением заключены:

1. в 2024 году 6 контрактов (договоров) на общую сумму 122 201 746,90 рублей, из них:

– конкурентным способом (конкурс, аукцион) – 2 контракта на сумму 121 502 327,00 рублей;

– неконкурентным способом заключено 4 договора¹⁷ на общую сумму 699 419,90 рублей.

2. в 2025 году 12 контрактов (договоров) (по состоянию на 27.08.2025) на общую сумму 145 792 382,90 рублей, из них:

– конкурентным способом (конкурс, аукцион) – 4 контракта на сумму 142 769 512,91 рублей;

– неконкурентным способом – 8 контрактов (договоров)¹⁸ на общую сумму 3 022 869,99 рублей.

Следует отметить, что при закупках неконкурентным способом, осуществленных напрямую, не обеспечивается равный доступ к участию в закупке всем потенциальным участникам соответствующего конкурентного рынка товаров, работ, услуг, что может повлиять на экономность и эффективность использования средств бюджета городского округа.

2. Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на мероприятие

Решением о бюджете № 97-нд¹⁹ (ред. от 20.12.2024) и муниципальной программой финансирование на выполнение основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» в 2024 году предусмотрено в размере 141 952 732,30 рублей, что не соответствует Решению № 193-нд²⁰, где предусмотрен годовой объем ассигнований в размере 140 724 625,36 рублей, согласно пояснениям сотрудников Управления расходования в годовом объеме ассигнований на 2024 год связано с тем, что Министерством финансов Камчатского края 27.12.2024 уведомлениями №№ 1180, 1182 сняты ранее доведенные с краевого бюджета ассигнования в размере 1 228 106,94 рублей, после утверждения 20.12.2024 Городской Думой городского округа бюджета

¹⁶ Далее – План-график закупок, План-график закупок Учреждения.

¹⁷ С единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

¹⁸ С единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов 4, 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

¹⁹ Здесь и далее -Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

²⁰ Здесь и далее - Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2025 № 193-нд «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2024 год».

ПКГО на 2024 год, фактическое исполнение – 138 755 225,02 рублей (97,75%)²¹, из них:

- на подмероприятие «Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании» в 2024 году – 3 417 873,75 рублей²², фактическое исполнение – 2 189 766,75 рублей;

- на подмероприятие «Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов» в 2024 году – 13 405 159,32 рублей²³, фактическое исполнение – 12 911 440,46 рублей;

- на подмероприятие «Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)» в 2024 году – 3 150 468,85 рублей²⁴, фактическое исполнение – 3 110 562,66 рублей;

- на подмероприятие «Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)» в 2024 году – 120 751 123,44 рублей²⁵, фактическое исполнение – 120 543 455,15 рублей.

В целях исполнения основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Учреждением заключены в 2024 году – 6 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 122 201 746,90 рублей, также в 2024 году выполнен и оплачен один муниципальный контракт от 31.01.2022 № 0138300000421000998²⁶ на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты и дорожные знаки, демонтаж, монтаж средств организации дорожного движения временного характера) на сумму 16 553 478,12 рублей.

Таблица 1

№ п/п	Дата и номер контракта/договора	Наименование контракта/договора	Цена контракта/договора (руб.)	Оплачено в 2024 году (руб.)
1.	от 31.01.2022 № 0138300000421000998	Муниципальный контракт по содержанию технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты и дорожные знаки, демонтаж, монтаж средств организации дорожного движения временного характера)	16 553 478,12	16 553 478,12
2.	от 25.04.2024 № 26/04/2024	Договор на выполнение работ по дооснащению автомобильных дорог техническими средствами регулирования (дорожное зеркало)	139 216,00	139 216,00
3.	от 02.05.2024 № 0138300000424000240	Муниципальный контракт на выполнение работ по установке дорожных знаков	975 962,50	975 962,50
4.	от 06.05.2024 № 28/05/2024	Договор на выполнение работ по установке дорожных знаков	341 071,35	341 071,35

²¹ 138 755 225,02/141 952 732,30*100.

²² Уведомления о бюджетных назначениях/об изменении бюджетных назначениях на 2024 год (2024 год и плановый период 2025-2026 годов) от 27.11.2023 № 27, от 02.01.2024 №№ 82,83, от 02.02.2024 № 190, от 26.04.2024 № 425, от 27.06.2024 № 534, от 05.08.2024 №№ 653, 654, от 31.10.2024 № 900, от 27.12.2024 №№ 1180, 1182.

²³ Уведомления о бюджетных назначениях/об изменении бюджетных назначениях на 2024 год (2024 год и плановый период 2025-2026 годов) от 27.11.2023 № 27, от 26.04.2024 № 425, от 31.10.2024 № 900.

²⁴ Уведомления о бюджетных назначениях/об изменении бюджетных назначениях на 2024 год (2024 год и плановый период 2025-2026 годов) от 27.11.2023 № 27, от 02.02.2024 № 194, от 26.04.2024 № 425, от 04.09.2024 № 751, от 23.09.2024 № 800, от 31.10.2024 № 900.

²⁵ Уведомления о бюджетных назначениях/об изменении бюджетных назначениях на 2024 год (2024 год и плановый период 2025-2026 годов) от 27.11.2023 № 27, от 02.02.2024 № 194, от 26.04.2024 № 425, от 04.09.2024 № 751, от 23.09.2024 № 800, от 31.10.2024 № 900.

²⁶ Далее – Контракт № 998.

5.	от 12.09.2024 № 51/09/2024	Договор на выполнение работ по установке новых дорожных знаков	82 506,93	82 506,93
6.	от 16.04.2024 №0138300000424000212	Муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки	120 526 364,50	120 526 364,50
7.	от 08.11.2024 № 71/11/2024	Договор на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог по ул. Ларина, 16, 16/1, 16/2, 16/3, ул. Строительная (СИЗО) техническими средствами регулирования дорожного движения	136 625,62	136 625,62
Итого:			138 755 225,02	138 755 255,02

По состоянию на 27.08.2025 Учреждением в 2025 году заключены 12 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 145 792 382,90 рублей, из них оплачено 9 муниципальных контрактов (договоров) – 4 006 161,74 рублей.

По результатам проверки муниципальных контрактов (договоров) установлено следующее.

Муниципальный контракт от 16.04.2024 № 0138300000424000212 на выполнение работ по нанесению дорожной разметки²⁷, заключенный МКУ «САД» с Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНССИГНАЛ»²⁸. Цена Контракта № 212 – 120 526 364,50 рублей²⁹.

Согласно пункту 1.1. Контракта № 212 подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по нанесению дорожной разметки (далее - Работы, в отношении указанных объектов - Объекты, Объект) для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с условиями Контракта № 212 и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик принимает на себя обязательства принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта № 212.

Место выполнения работ, виды, объем работ, а также иные, предъявляемые к выполнению работ требования, определены Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту № 212)³⁰.

Срок оплаты Заказчиком выполненной работы составляет, не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ³¹.

Срок окончания выполнения работ - 31 октября 2024 года³².

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке работ, подписанного Заказчиком³³.

Согласно актам о приемке выполненных работ от 24.07.2024 № 1 (подписан Заказчиком 29.07.2024) и от 05.11.2024 № 2 (подписан Заказчиком 02.12.2024) работы приняты Заказчиком в полном объеме 02.12.2024.

Оплата выполненных работ произведена платежными поручениями от 01.08.2024 № 799164 и от 05.12.2024 № 321780 на общую сумму 120 526 364,50 рублей в установленный законом сроки.

²⁷ Далее – Контракт № 212.

²⁸ В рамках Контракта № 212 – Подрядчик, Поставщик.

²⁹ Пункт 2.1. Контракта № 212.

³⁰ Пункт 1.4. Контракта № 212.

³¹ Пункт 2.7. Контракта № 212.

³² Пункт 3.2. Контракта № 212.

³³ Пункт 7.13. Контракта № 212.

На запрос КСП от 10.09.2025 о причинах неведения претензионной работы в связи с нарушением срока исполнения Контракта № 212 Подрядчиком (срок исполнения Контракта № 212 – 31.10.2024, Акт о приемке выполненных работ № 2 размещен 05.11.2024, а работы фактически приняты только 02.12.2024), предоставлена пояснительная записка ведущего инженера-энергетика (вх. от 24.09.2025 № 12-КСП-00/151-Д/25): «По муниципальному контракту от 16.04.2024 № 0138300000424000212 претензионная работа не проводилась, т.к. не требовалось».

По итогам анализа Договоров №№ 27/04/2025³⁴, 30/05/2025³⁵, 31/05/2025³⁶, 32/05/2025³⁷ установлено, что заключенные Договоры №№ 27/04/2025, 30/05/2025, 31/05/2025, 32/05/2025 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- четыре Договора заключены с одним тем же Исполнителем (Индивидуальным предпринимателем Ахмадуллиным Игорем Ильдусовичем);

- Договоры №№, 30/05/2025, 31/05/2025, 32/05/2025 заключены на выполнение работ по устройству знаков «временное ограничение движения» на улицах в г. Петропавловске-Камчатском, Договор № 27/04/2025 заключен на выполнение работ по ремонту технических средств регулирования дорожного движения;

- суммы по договорам приближены к разрешенной в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не более 600 000,00 рублей, а именно по Договорам № 27/04/2025 – 598 592,14 рублей, № 30/05/2024 – 599 994,96 рублей, № 31/05/2025 – 598 984,98 рублей, № 32/05/2025 – 322 176,92 рублей;

- согласно спецификации (Приложение № 1 к Договорам №№ 27/04/2025, 30/05/2025, 31/05/2025, 32/05/2025) объем и виды работ по многим позициям совпадают, например: завешивание установленных дорожных знаков пленкой, замена (демонтаж/монтаж) дорожных знаков с перевозкой на 8 км, установка дорожных знаков и другие.

Согласно пояснений Учреждения от 09.10.2025 № 5314/25: «Вместе с тем в отношении заключенных договоров №№ 27/04/2025, 30/04/2025, 31/05/2025, 32/05/2025 в части ограничения конкуренции в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ сообщаем следующее. Изменение схем организации дорожного движения по ул. Ленинская, Советская, Пограничная, Набережная выполнялась на основании Постановлений Главы Петропавловск-Камчатского городского округа № 765 от

³⁴ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по ремонту технических средств регулирования дорожного движения от 04.04.2024 № 27/04/2025.

³⁵ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по устройству знаков «временное ограничение движения» на ул. Озерновская коса, ул. Советская в г. Петропавловске-Камчатском от 30.04.2025 № 30/05/2025.

³⁶ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по устройству знаков «временное ограничение движения» на ул. Ленинская, ул. Пограничная, ул. Набережная в г. Петропавловске-Камчатском от 05.05.2025 № 31/05/2025.

³⁷ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по устройству знаков на «временное ограничение движения грузовых транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 5 тонн» на следующих автомобильных дорогах общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.05.2025 № 32/05/2025.

10.04.2025, № 812 от 14.04.2025, № 880 от 18.04.2025, № 1041 от 15.05.2025, № 1042 от 15.05.2025 (далее - Постановление Главы). Сроки исполнения указаны в Постановлении Главы и не предполагают отсрочки по времени. Подрядная организация ИП «Ахмадулин И.И.» располагает необходимым запасом дорожных знаков, а также имеет производственную линию и материалы по их изготовлению, отсутствует необходимость доставки дорожных знаков с материка и сокращению срока исполнения договора и как следствие, срыва срока исполнения Постановления Главы.».

На основании вышеизложенного факт ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ также подтверждается пояснениями Учреждения от 09.10.2025 № 5314/25.

Муниципальный контракт от 02.05.2024 № 0138300000424000240 на выполнение работ по установке дорожных знаков³⁸, заключенный МКУ «САД» с индивидуальным предпринимателем Ахмадуллиным Ильдусом Магияровичем³⁹. Цена Контракта № 240 – 975 962,50 рублей.

Учреждением расчет НМЦК на выполнение работ по установке дорожных знаков произведен иным методом (сметным расчетом)⁴⁰ на сумму 1 006 146,94 рублей. Вместе с тем, дополнительным соглашением к Контракту № 240 от 15.05.2024 № 1 определено, что работы по установке дорожных знаков производятся в рамках капитального ремонта и согласно подпункту 1)⁴¹ пункта 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ Учреждением должен быть применен проектно-сметный метод обоснования НМЦК.

На запрос КСП от 10.09.2025 пояснить причины применения иного метода определение начальной (максимальной) цены Контракта № 240, при том, что ремонт по установке дорожных знаков выполнялся в рамках капитального ремонта (согласно информации, указанной в дополнительном соглашении к Контракту № 240 от 15.05.2024 № 1), предоставлена пояснительная записка ведущего инженера-энергетика (вх. от 24.09.2025 № 12-КСП-00/151-Д/25): «По Муниципальному контракту от 02.05.2024 № 0138300000424000240 обоснование начальной максимальной цены контракта – приложено».

В дополнительном соглашении к Контракту № 240 от 15.05.2024 № 1 пункт 1.1. Контракта № 240 изложен в следующей редакции: «Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по установке дорожных знаков в рамках капитального ремонта (далее - Работы, в отношении указанных объектов - Объекты, Объект) для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского

³⁸ Далее – Контракт № 240.

³⁹ В рамках Контракта № 240 – Подрядчик.

⁴⁰ Согласно обоснованию НМЦК от 28.03.2024, размещенному в ЕИС.

⁴¹ Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или исполнительным органом субъекта Российской Федерации.

городского округа в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик принимает на себя обязательства принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта».

На запрос КСП от 10.09.2025 пояснить (указать) в соответствии с какими частями статей 34 и 95 Закона № 44-ФЗ внесены изменения в Контракт № 240 дополнительным соглашением от 15.05.2024 № 1, предоставлена пояснительная записка ведущего инженера-энергетика (вх. от 24.09.2025 № 12-КСП-00/151-Д/25): «По Муниципальному контракту от 02.05.2024 № 0138300000424000240 пояснить не представляется возможным, т.к. специалист в настоящий момент не работает».

Цена Контракта № 240 составляет 975 962,50 рублей, НДС не облагается⁴².

Срок оплаты Заказчиком выполненной работы составляет, не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документах о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке⁴³.

Срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта № 240⁴⁴.
Срок окончания выполнения работ – 31.05.2024⁴⁵.

16.05.2024 Подрядчиком Учреждению представлены счет от 16.05.2024 № 38, Акт от 16.05.2024 № 38, Акт о приемке выполненных работ (КС-3) от 16.05.2024 № 1, справка о стоимости выполненных работ (КС-3) от 16.05.2024 № 1, документы, подтверждающие качество и пригодность материалов, использованных при выполнении работ (сертификат соответствия № РОСС КR.НВ63.Н00159/21 – продукция световозвращающая пленка RLITE-5200 (тип А), сертификат соответствия № RA.RU.НВ87.Н021003 – материал световозвращающий (МСВ) для дорожных знаков, сертификат качества № 129-9323 – сталь оцинкованная, сертификат качества от 28.05.2021 № 702310 – трубы стальные электросварные, трубы стальные профильные), а также в ЕИС размещен документ о приемке – Акт о приемке выполненных работ от 16.05.2024 № 1 на сумму 975 962,50 рублей.

Согласно пункту 7.10. Контракта № 240 Учреждением проведена экспертиза и составлено заключение о соответствии результатов предъявляемых к приемке работ требованиям и условиям исполнения Контракта № 240 от 21.05.2024 – нарушений не зафиксировано.

Учреждением 22.05.2024 в ЕИС подписан документ о приемке – Акт о приемке выполненных работ от 16.05.2024 № 1, платежным поручением от 29.05.2024 № 595357 произведена оплата по Контракту № 240 на сумму 975 962,50 рублей.

Муниципальный контракт от 31.01.2022 № 0138300000421000998 на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования

⁴² Пункт 2.1. Контракта № 240.

⁴³ Пункт 2.6. Контракта № 240.

⁴⁴ Пункт 3.1. Контракта № 240.

⁴⁵ Пункт 3.2. Контракта № 240.

дорожного движения (светофорные объекты и дорожные знаки, демонтаж, монтаж средств организации дорожного движения временного характера)⁴⁶, заключенный МКУ «САД» с Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожник»⁴⁷. Цена Контракта № 998 – 47 952 048,41 рублей⁴⁸.

Пунктом 1.1 Контракта № 998 предусмотрено, что Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить работы по содержанию технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты и дорожные знаки, демонтаж, монтаж средств организации дорожного движения временного характера) (далее по тексту – Работы, в отношении указанных объектов – Объект, Объекты) для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с условиями Контракта № 998 и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик принимает на себя обязательства принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта № 998.

Работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта, Сметным расчетом (Приложение № 3 к Контракту № 998), Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту № 998), определяющими состав (объем), условия, порядок, содержание (виды) работ и другие, предъявляемые к ним требования, требования к качеству, в соответствии с действующими нормативными документами, правил охраны труда, правил техники безопасности, правил пожарной и экологической безопасности, с соблюдением СП, СНиП на соответствующие виды работ, ГОСТ, технических условий, стандартов, требований, иных нормативных правовых документов, действующих на территории Российской Федерации в момент исполнения Контракта № 998, в полном объеме и в установленный Контрактом № 998 срок, а также в соответствии с Проектной документацией, разработанной ООО «Арх-студия Питер» - шифр проекта: 226 «Конструкция крепления светофоров и дорожных знаков к опоре освещения для г. Петропавловска-Камчатского» (Приложение № 4 к Контракту № 998), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их⁴⁹.

Стоимость выполнения работ определяется согласно Сметному расчету (Приложение № 3 к Контракту № 998) с учетом процента снижения в соответствии с протоколом, указанным в пункте 2.1. Контракта № 998, относительно начальной (максимальной) цены Контракта № 998⁵⁰.

Оплата осуществляется в форме безналичного расчета – расчет платежными поручениями в течение 15 (пятнадцати) дней после сдачи Подрядчиком работ и подписания Заказчиком надлежаще оформленных документов, подтверждающих приемку фактически выполненных работ. Документами, подтверждающими приемку работ Заказчиком, являются оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и подписанные обеими Сторонами акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением счета (счет-фактуры), а также экспертное заключение о соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и

⁴⁶ Далее – Контракт № 998.

⁴⁷ В рамках Контракта № 998 – Подрядчик.

⁴⁸ Цена Контракта № 998 указана с учетом дополнительного соглашения от 15.04.2024 № 5.

⁴⁹ Пункт 1.2 Контракта № 998.

⁵⁰ Пункт 2.1.1 Контракт № 998.

условиям исполнения Контракта № 998, при условии, что работы выполнены надлежащим образом⁵¹.

Согласно пункту 3.2 Контракта № 998 срок окончания выполнения работ – 31.12.2024.

Согласно актам о приемке выполненных работ⁵² по Контракту № 998 всего за 2022-2024 годы выполнено работ на общую сумму 47 250 661,26 рублей оплата произведена в полном объеме⁵³.

По результатам рассмотрения технического задания (приложение № 1 к Контракту № 998) и требований Контракта № 998 установлено следующее.

В соответствии с пунктами 2,3,4 технического задания (приложение № 1 к Контракту № 998) всего необходимо осуществить обслуживание 45 светофорных объектов (ежемесячно), что также подтверждается списком светофорных объектов, указанным в пункте 1.1 технического задания (приложение № 1 к Контракту № 998) и отчетом об исполнении муниципальной программы по показателю «количество светофорных объектов, подлежащих содержанию» за год 45 штук.

В нарушение пункта 1.2 Контракта № 998 и пунктов 1.1, 2, 3, 4 технического задания (приложение № 1 к Контракту № 998) Учреждение принимало и оплачивало работы по ежемесячному обслуживанию светофорных объектов в количестве большем, чем фактически числится на балансе Учреждения и установлено Контрактом № 998, а именно:

- согласно актам о приемке выполненных работ от 01.03.2022 № 1, от 01.04.2022 № 2, от 01.05.2022 № 3, от 01.06.2022 № 4, от 01.07.2022 № 5, от 01.08.2022 № 6, от 01.09.2022 № 7, от 03.10.2022 № 8, от 10.11.2022 № 9, от 01.12.2022 № 10 фактически ежемесячно в 2022 году обслуживались 49 светофорных объектов, то есть на 4 светофорных объекта больше, чем числится на балансе Учреждения и установлено Контрактом № 998, а по акту о приемке выполненных работ от 11.12.2022 № 11 – 5 светофорных объектов, всего данные действия Учреждения в 2022 году привели к неэффективному расходованию средств городского бюджета в размере 169 051,50 рублей⁵⁴;

- согласно актам о приемке выполненных работ от 30.04.2024 № 28, от 30.06.2024 № 29, от 01.07.2024 № 30, 01.08.2024 № 31, от 02.09.2024 № 32 от 01.10.2024 № 33 фактически ежемесячно в 2024 году обслуживались 57 светофорных

⁵¹ Пункт 2.3 Контракта № 998.

⁵² Акты от 01.03.2022 № 1, от 01.04.2022 № 2, от 01.05.2022 № 3, от 01.06.2022 № 4, от 01.07.2022 № 5, от 01.08.2022 № 6, от 01.09.2022 № 7, от 03.10.2022 № 8, от 10.11.2022 № 9, от 01.12.2022 № 10, от 11.12.2022 № 11, от 09.01.2023 № 12, от 01.02.2023 № 13, от 01.03.2023 № 14, от 03.04.2023 № 15, от 02.05.2023 № 16, от 31.05.2023 № 17, от 01.07.2023 № 18, от 31.07.2023 № 19, от 31.08.2023 № 20, от 02.10.2023 № 21, от 31.10.2023 № 22, от 30.11.2023 № 23, от 20.12.2023 № 24, от 01.02.2024 № 25, от 29.02.2024 № 26, от 01.04.2024 № 27, от 30.04.2024 № 28, от 30.06.2024 № 29, от 01.07.2024 № 30, 01.08.2024 № 31, от 02.09.2024 № 32 от 01.10.2024 № 33, от 01.11.2024 № 34, от 01.12.2024 № 35, от 20.12.2024 № 36.

⁵³ Платежными поручениями от 28.04.2022 № 473519, от 29.04.2022 № 484109, от 20.05.2022 № 630339, от 09.06.2022 № 804954, от 20.06.2022 № 855547, от 13.07.2022 № 49468, от 16.09.2022 № 277350, от 28.10.2022 № 427859, от 18.11.2022 № 509991, от 16.12.2022 № 620364, от 27.12.2022 № 677701, от 27.01.2023 № 755610, от 21.02.2023 № 843081, от 23.03.2023 № 54611, от 11.04.2023 № 121091, от 11.05.2023 № 225705, от 14.06.2023 № 343820, от 11.07.2023 № 431221, от 10.08.2023 № 521210, от 13.09.2023 № 615075, от 20.10.2023 № 737340, от 15.11.2023 № 829871, от 13.12.2023 № 33005, от 26.12.2023 № 87846, от 19.02.2024 № 244247, от 15.03.2024 № 340045, от 15.04.2024 № 451326, от 16.05.2024 № 555790, от 19.06.2024 № 667900, от 12.07.2024 № 749102, от 14.08.2024 № 844410, от 12.09.2024 № 31516, от 16.10.2024 № 147295, от 22.11.2024 № 279266, от 12.12.2024 № 358604, от 27.12.2024 № 443529 и заявкой на кассовый расход от 17.08.2022 №0000-000885.

⁵⁴ 45 (4 месяца*10+5) светофорных объектов * 3 756,70 рублей (цена за 1 единицу работ).

объектов, то есть на 12 светофорных объекта больше, чем числится на балансе Учреждения и установлено контрактом № 998, всего данные действия Учреждения в 2024 году привели к неэффективному расходованию средств городского бюджета в размере 292 556,16 рублей⁵⁵.

В нарушение пункта 1.2 контракта № 998 и пунктов 2, 3, 4 технического задания (приложение № 1 к контракту № 998) Учреждение принимало и оплачивало работы по квартальному техническому обслуживанию 7 контроллеров типа ДК2М в количестве большем, чем установлено контрактом № 998, а именно:

- согласно актам о приемке выполненных работ 01.05.2022 № 3, от 01.06.2022 № 4, от 01.07.2022 № 5 во втором квартале 2022 года фактически обслуживалось 9 контроллеров типа ДК2М, то есть на 2 контроллера типа ДК2М больше, чем установлено контрактом № 998. Аналогично, в третьем квартале 2022 года, согласно актам о приемке выполненных работ от 01.08.2022 № 6, от 01.09.2022 № 7, от 03.10.2022 № 8, также обслуживалось на 2 контроллера типа ДК2М больше, чем установлено контрактом № 998. Всего данные действия Учреждения в 2022 году привели к неэффективному расходованию средств городского бюджета в размере 34 160,80 рублей⁵⁶;

- согласно акту о приемке выполненных работ от 20.12.2024 № 36 в четвертом квартале 2024 года фактически обслуживалось 9 контроллеров типа ДК2М, то есть на 2 контроллера типа ДК2М больше, чем установлено контрактом № 998, всего данные действия Учреждения в 2024 году привели к неэффективному расходованию средств городского бюджета в размере 18 468,34 рублей⁵⁷.

В нарушение пункта 1.2 контракта № 998 и пунктов 2, 3, 4 технического задания (приложение № 1 к контракту № 998) Учреждение принимало и оплачивало работы по квартальному техническому обслуживанию 38 контроллеров КС-2, КС-2МА в количестве большем, чем установлено контрактом № 998, а именно:

- согласно актам о приемке выполненных работ 01.05.2022 № 3, от 01.06.2022 № 4, от 01.07.2022 № 5 во втором квартале 2022 года фактически обслуживалось 42 контроллера типа КС-2, КС-2МА, то есть на 4 контроллера типа КС-2, КС-2МА больше, чем установлено контрактом № 998. Аналогично, в третьем квартале 2022 года, согласно актам о приемке выполненных работ от 01.08.2022 № 6, от 01.09.2022 № 7, от 03.10.2022 № 8, также обслуживалось на 4 контроллера типа КС-2, КС-2МА больше, чем установлено контрактом № 998. Всего данные действия Учреждения в 2022 году привели к неэффективному расходованию средств городского бюджета в размере 30 681,44 рублей⁵⁸;

- согласно акту о приемке выполненных работ от 20.12.2024 № 36 в четвертом квартале 2024 года фактически обслуживалось 39 контроллеров КС-2, КС-2МА, то есть на 1 контроллер типа КС-2, КС-2МА больше, чем установлено контрактом № 998, всего данные действия Учреждения в 2024 году

⁵⁵ 72 (6 месяцев*12) светофорных объекта* 4 063,28 рублей (цена за 1 единицу работ).

⁵⁶ 4 контроллера типа ДК2М * 8 540,20 рублей (цена за 1 единицу работ).

⁵⁷ 2 контроллера типа ДК2М * 9 234,17 рублей (цена за 1 единицу работ).

⁵⁸ 8 контроллеров типа КС-2, КС-2МА * 3 835,18 рублей (цена за 1 единицу работ).

привели к неэффективному расходованию средств городского бюджета в размере 4 148,20 рублей⁵⁹.

В рамках проводимого Контрольно-счетной палатой мероприятия направлен запрос в Учреждение от 10.09.2025 по Контракту № 998:

- о причинах принятия работ по обслуживанию светофоров, не указанных в Контракте № 998. Также предоставить перечень светофоров, не указанных в Контракте № 998 которые обслуживал Подрядчик и оплачивал Заказчик. Предоставить документы подтверждающие, что светофоры, которые обслуживал Подрядчик не указанные в Контракте № 998, находятся на балансе МКУ «САД» (наименование работы согласно Контракта № 998: Ежемесячное обслуживание 45 светофорных объектов – в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре обслуживали согласно актам ежемесячно 57 светофорных объектов);

- о причинах увеличения работ по квартальному техническому обслуживанию 7 контроллеров типа ДК2М и квартальному техническому обслуживанию 38 контроллеров КС-2, КС-2МА, согласно дополнительному соглашению от 15.04.2024 № 5 было 28 и 152 соответственно, стало 30 и 153 соответственно. (при этом фактически можно было выполнить работы в количестве 28 (4*7) и 152 (38*4).

На вышеуказанный запрос КСП от 10.09.2025 Учреждением представлено пояснение ведущего инженера-энергетика (пояснительная записка вх. от 24.09.2025 № 12-КСП-00/151-Д/25): «По Муниципальному контракту от 31.01.2022 № 0138300000421000998: Все работы проведены согласно дополнительных соглашений к контракту». Также к акту контрольного мероприятия Учреждение (исх. от 09.10.2025 № 5314/25) сообщило следующее по данному вопросу: «Дополнительно сообщаем, возникла необходимость дополнительного обслуживания светофорных объектов и контроллеров, на этом основании и было заключено дополнительное соглашение».

Вместе с тем Учреждением не представлены документы (акт обследования, дефектовочный акт и т.д.) подтверждающие необходимость проведения дополнительного обслуживания светофорных объектов и контроллеров помимо заложенного обслуживания в Контракте № 998. Представленная копия письма Подрядчика от 02.10.2023 № б/н без подтверждающих необходимость проведения дополнительных работ документов (акта обследования, дефектовочного акта и т.д.) не является основанием для проведения дополнительных работ, так как датировано октябрём 2023 года, а обслуживание в рамках Контракта № 998 проводилось в том числе в октябре и в ноябре 2023 года и т.д. В указанный выше период времени Подрядчик обязан был провести работы, указанные в Контракте № 998, так как они относятся к обслуживанию. Также, работы по дополнительному обслуживанию начались лишь в феврале 2024 года.

Данные действия Заказчика согласно статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются неэффективным использованием бюджетных средств городского округа в размере 549 066,44 рублей.

⁵⁹ 1 контроллер типа КС-2, КС-2МА * 4 148,20 рублей (цена за 1 единицу работ).

3. Выборочный визуальный осмотр (контрольные обмеры) приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации мероприятия

В ходе проведения контрольного мероприятия сотрудником МКУ САД и Контрольно-счетной палаты проведен выборочный визуальный осмотр и фотосъемка выполненных работ по следующим Договорам от 25.04.2024 № 26/04/2024, от 26.03.2025 № 21/03/2025 по итогам которого составлен Акт визуального осмотра от 17.09.2025 и установлено, что:

1. По Договору от 25.04.2024 № 26/04/2024:

- произведена работа по дооснащению автомобильных дорог техническими средствами регулирования (дорожное зеркало), место выполнения работ: сооружение дорожного транспорта пр. Циолковского, визуальным осмотром выявлено, что дорожное зеркало установлено и находится в рабочем состоянии, вместе с тем, при близком рассмотрении дорожного зеркала установлено, что оно повреждено в двух местах – присутствуют трещины (Фото № 1,2).

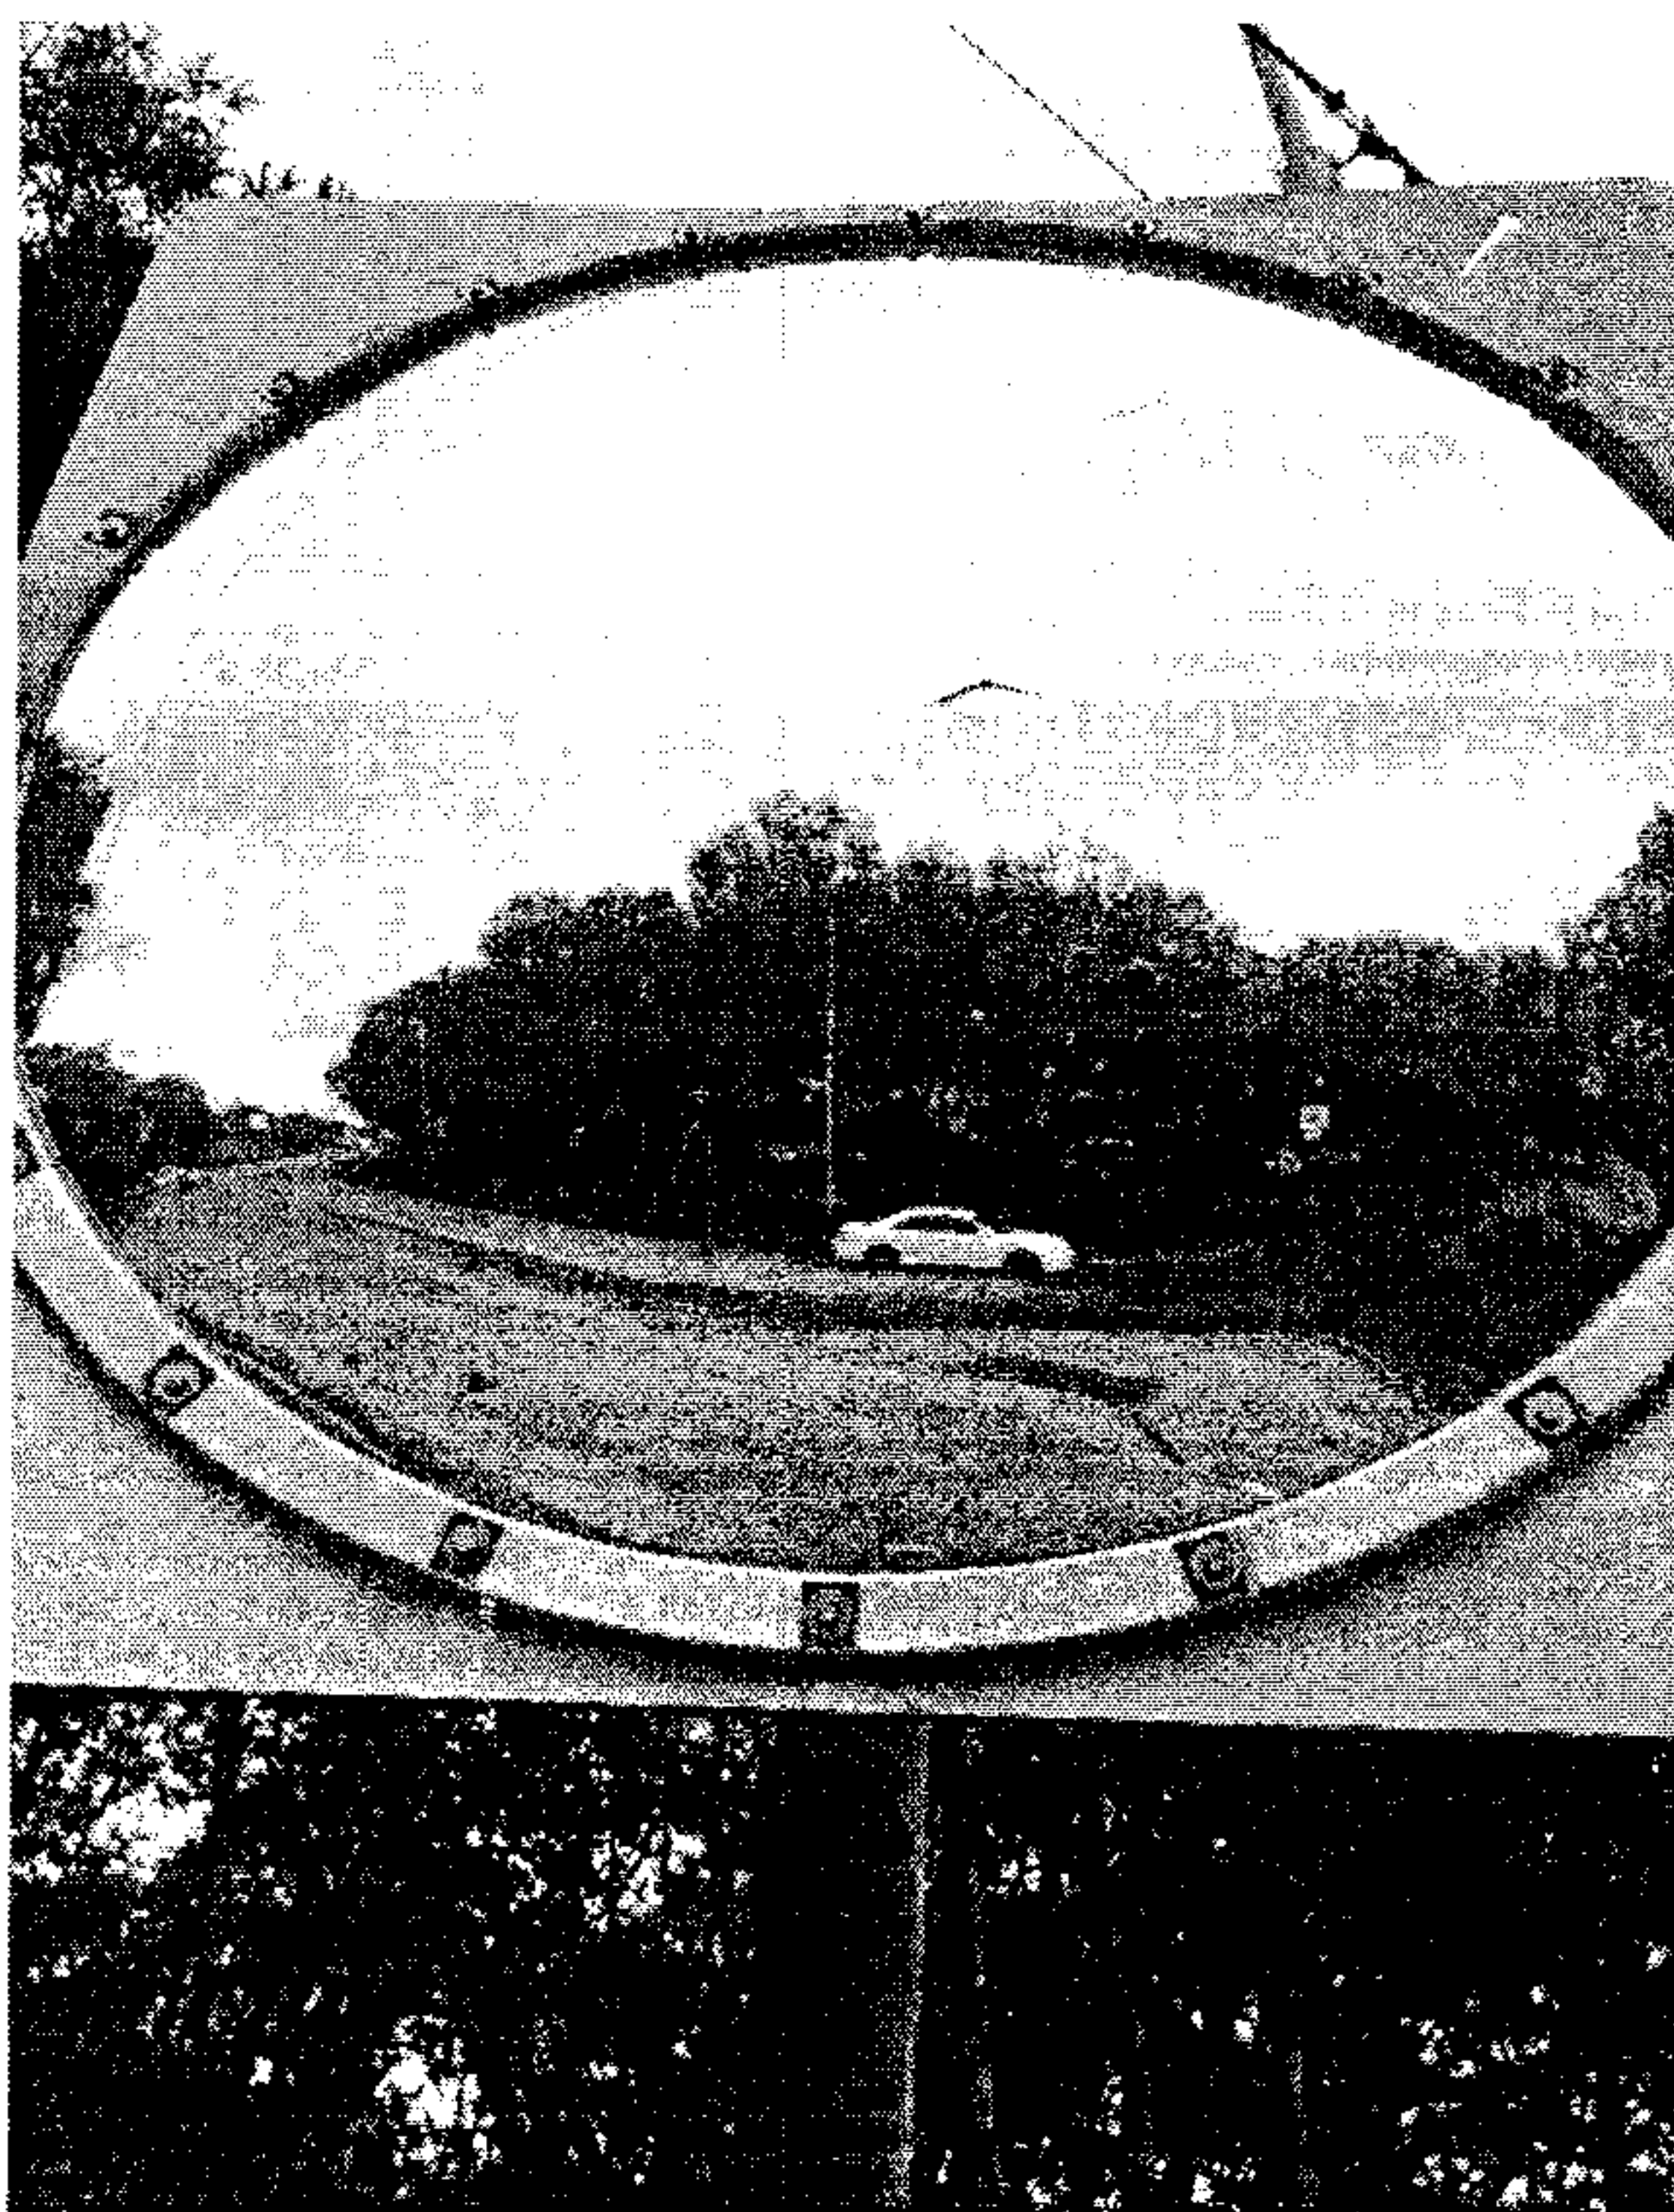


Фото № 1



Фото № 2

2. По Договору от 26.03.2025 № 21/03/2025: произведены работы по содержанию технических средств регулирования дорожного движения в г. Петропавловске-Камчатском:

- замена дорожных знаков 1.17, 3.24 по адресу: сооружение автомобильная дорога Омская улица (Фото №№ 3,4);



Фото № 3

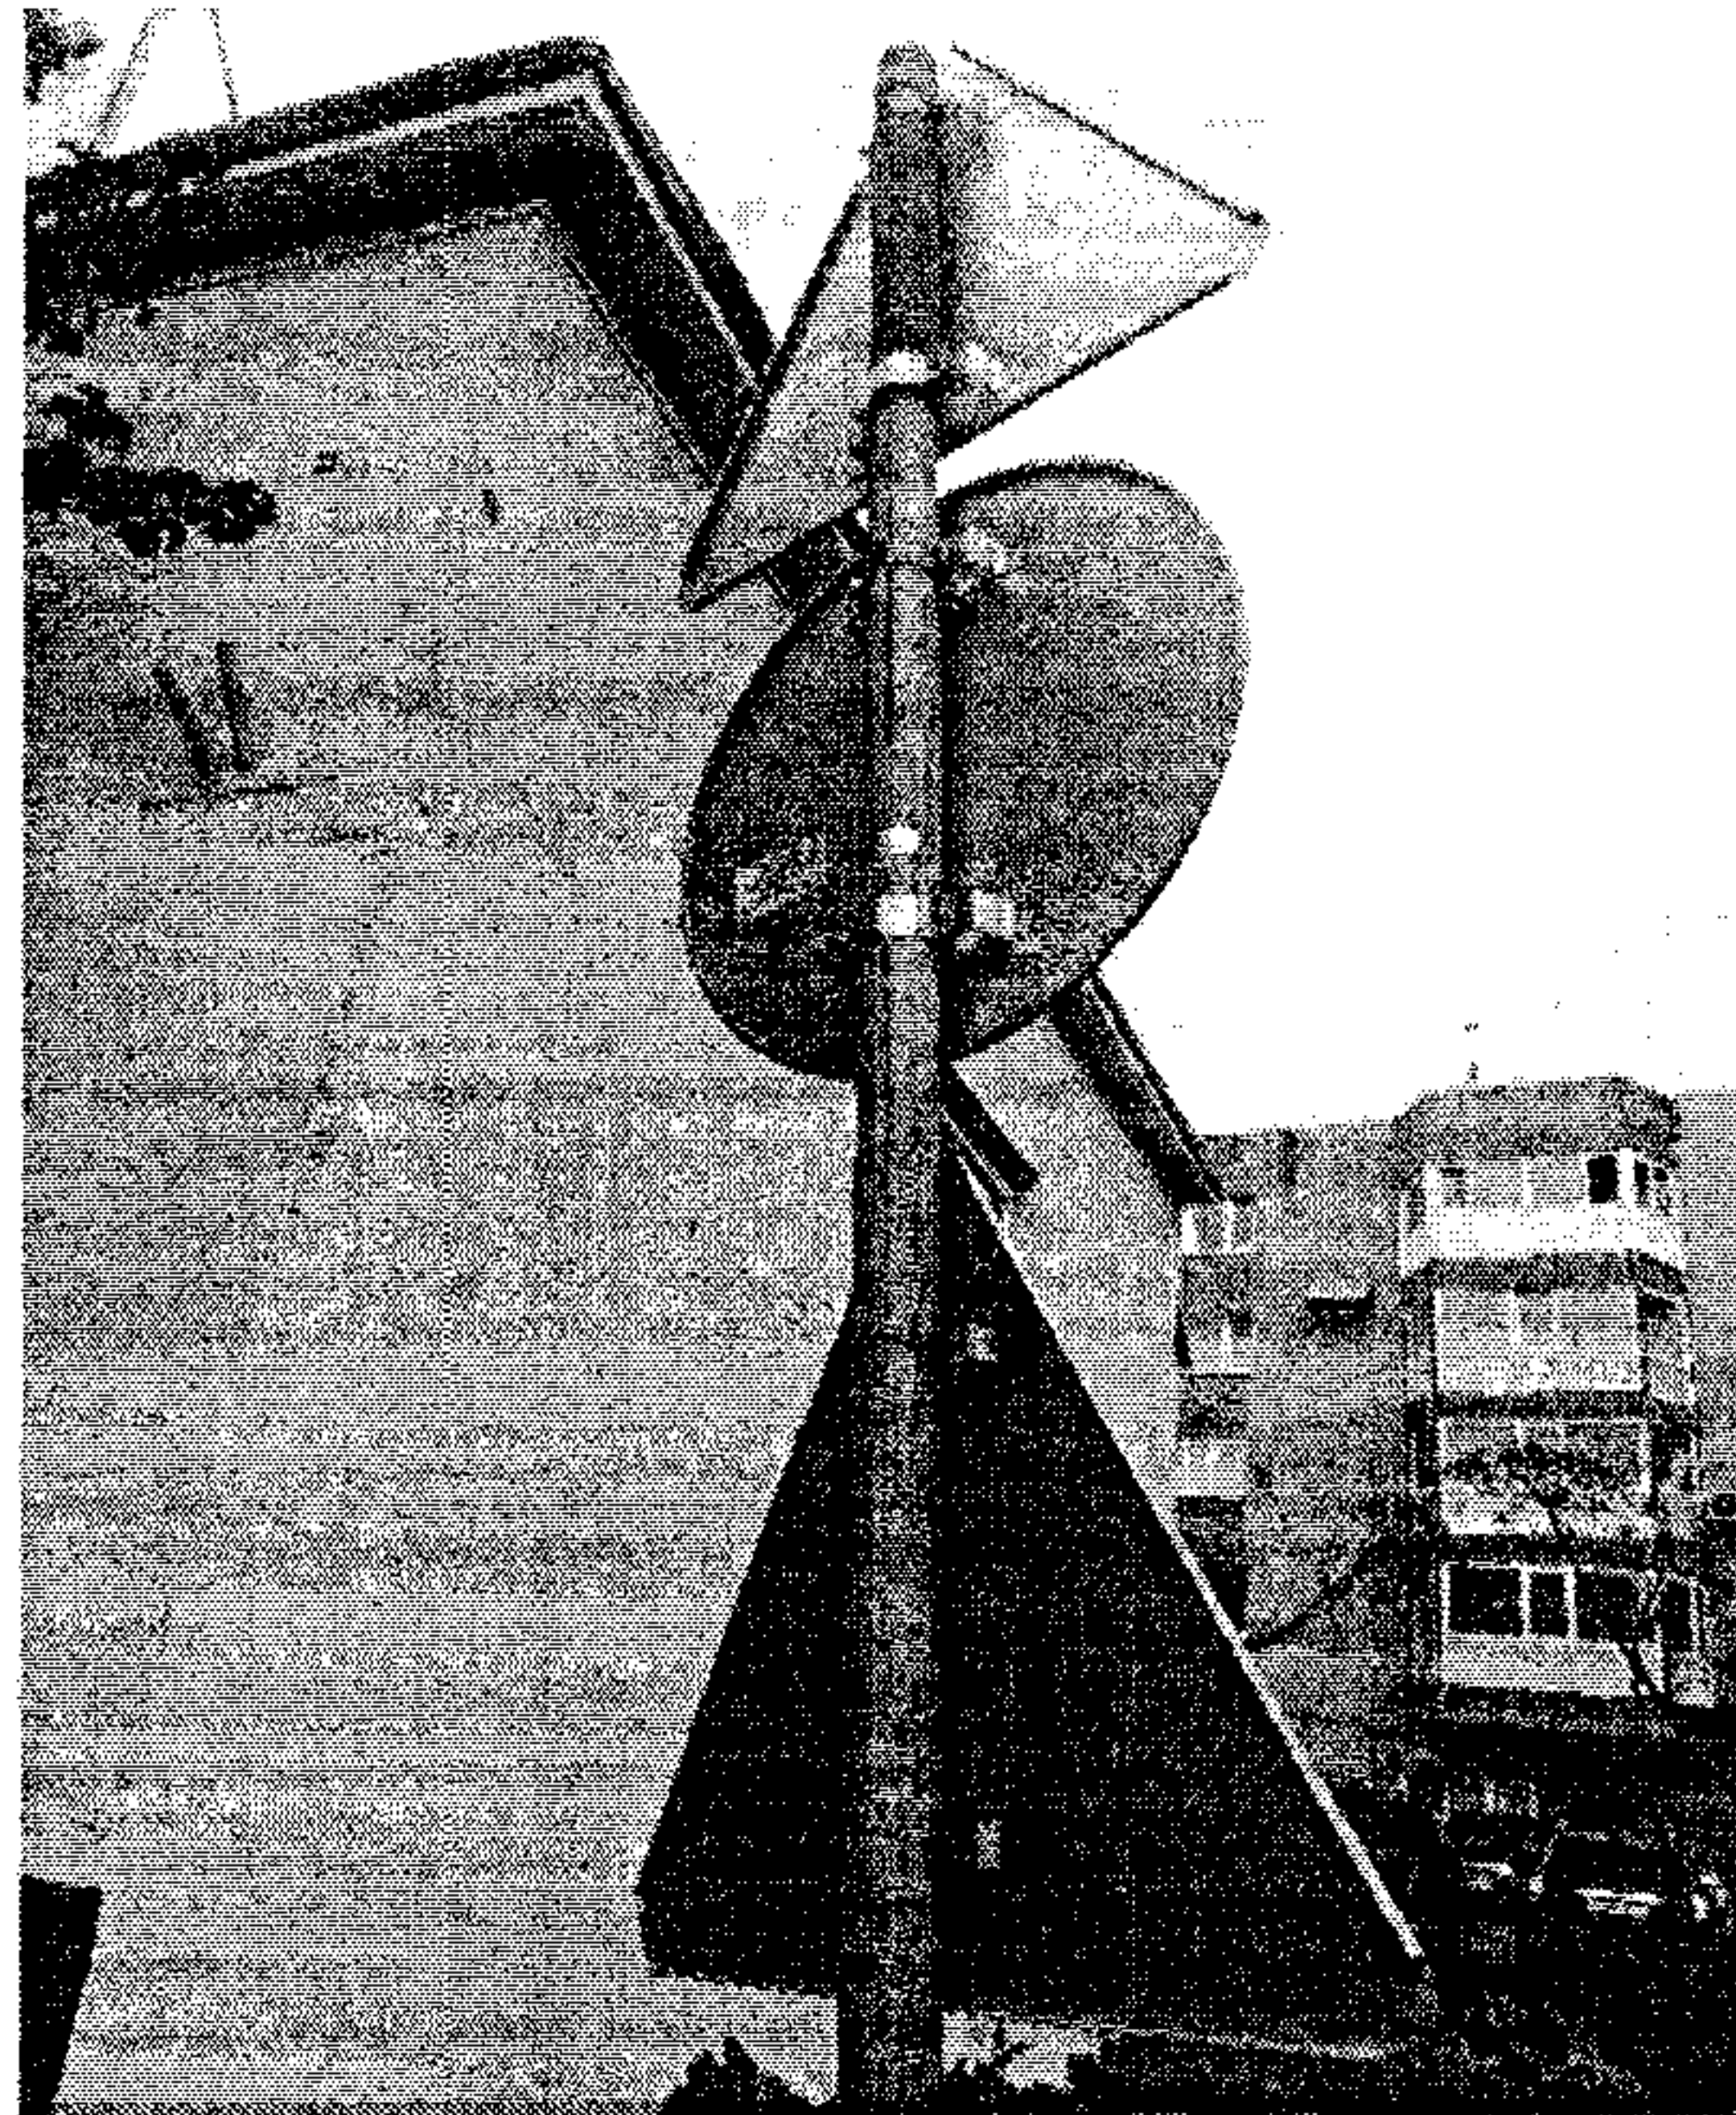


Фото № 4

- замена дорожного знака 3.24 по адресу: автомобильная дорога ул. Войцешка (Фото №№ 5,6);



Фото № 5

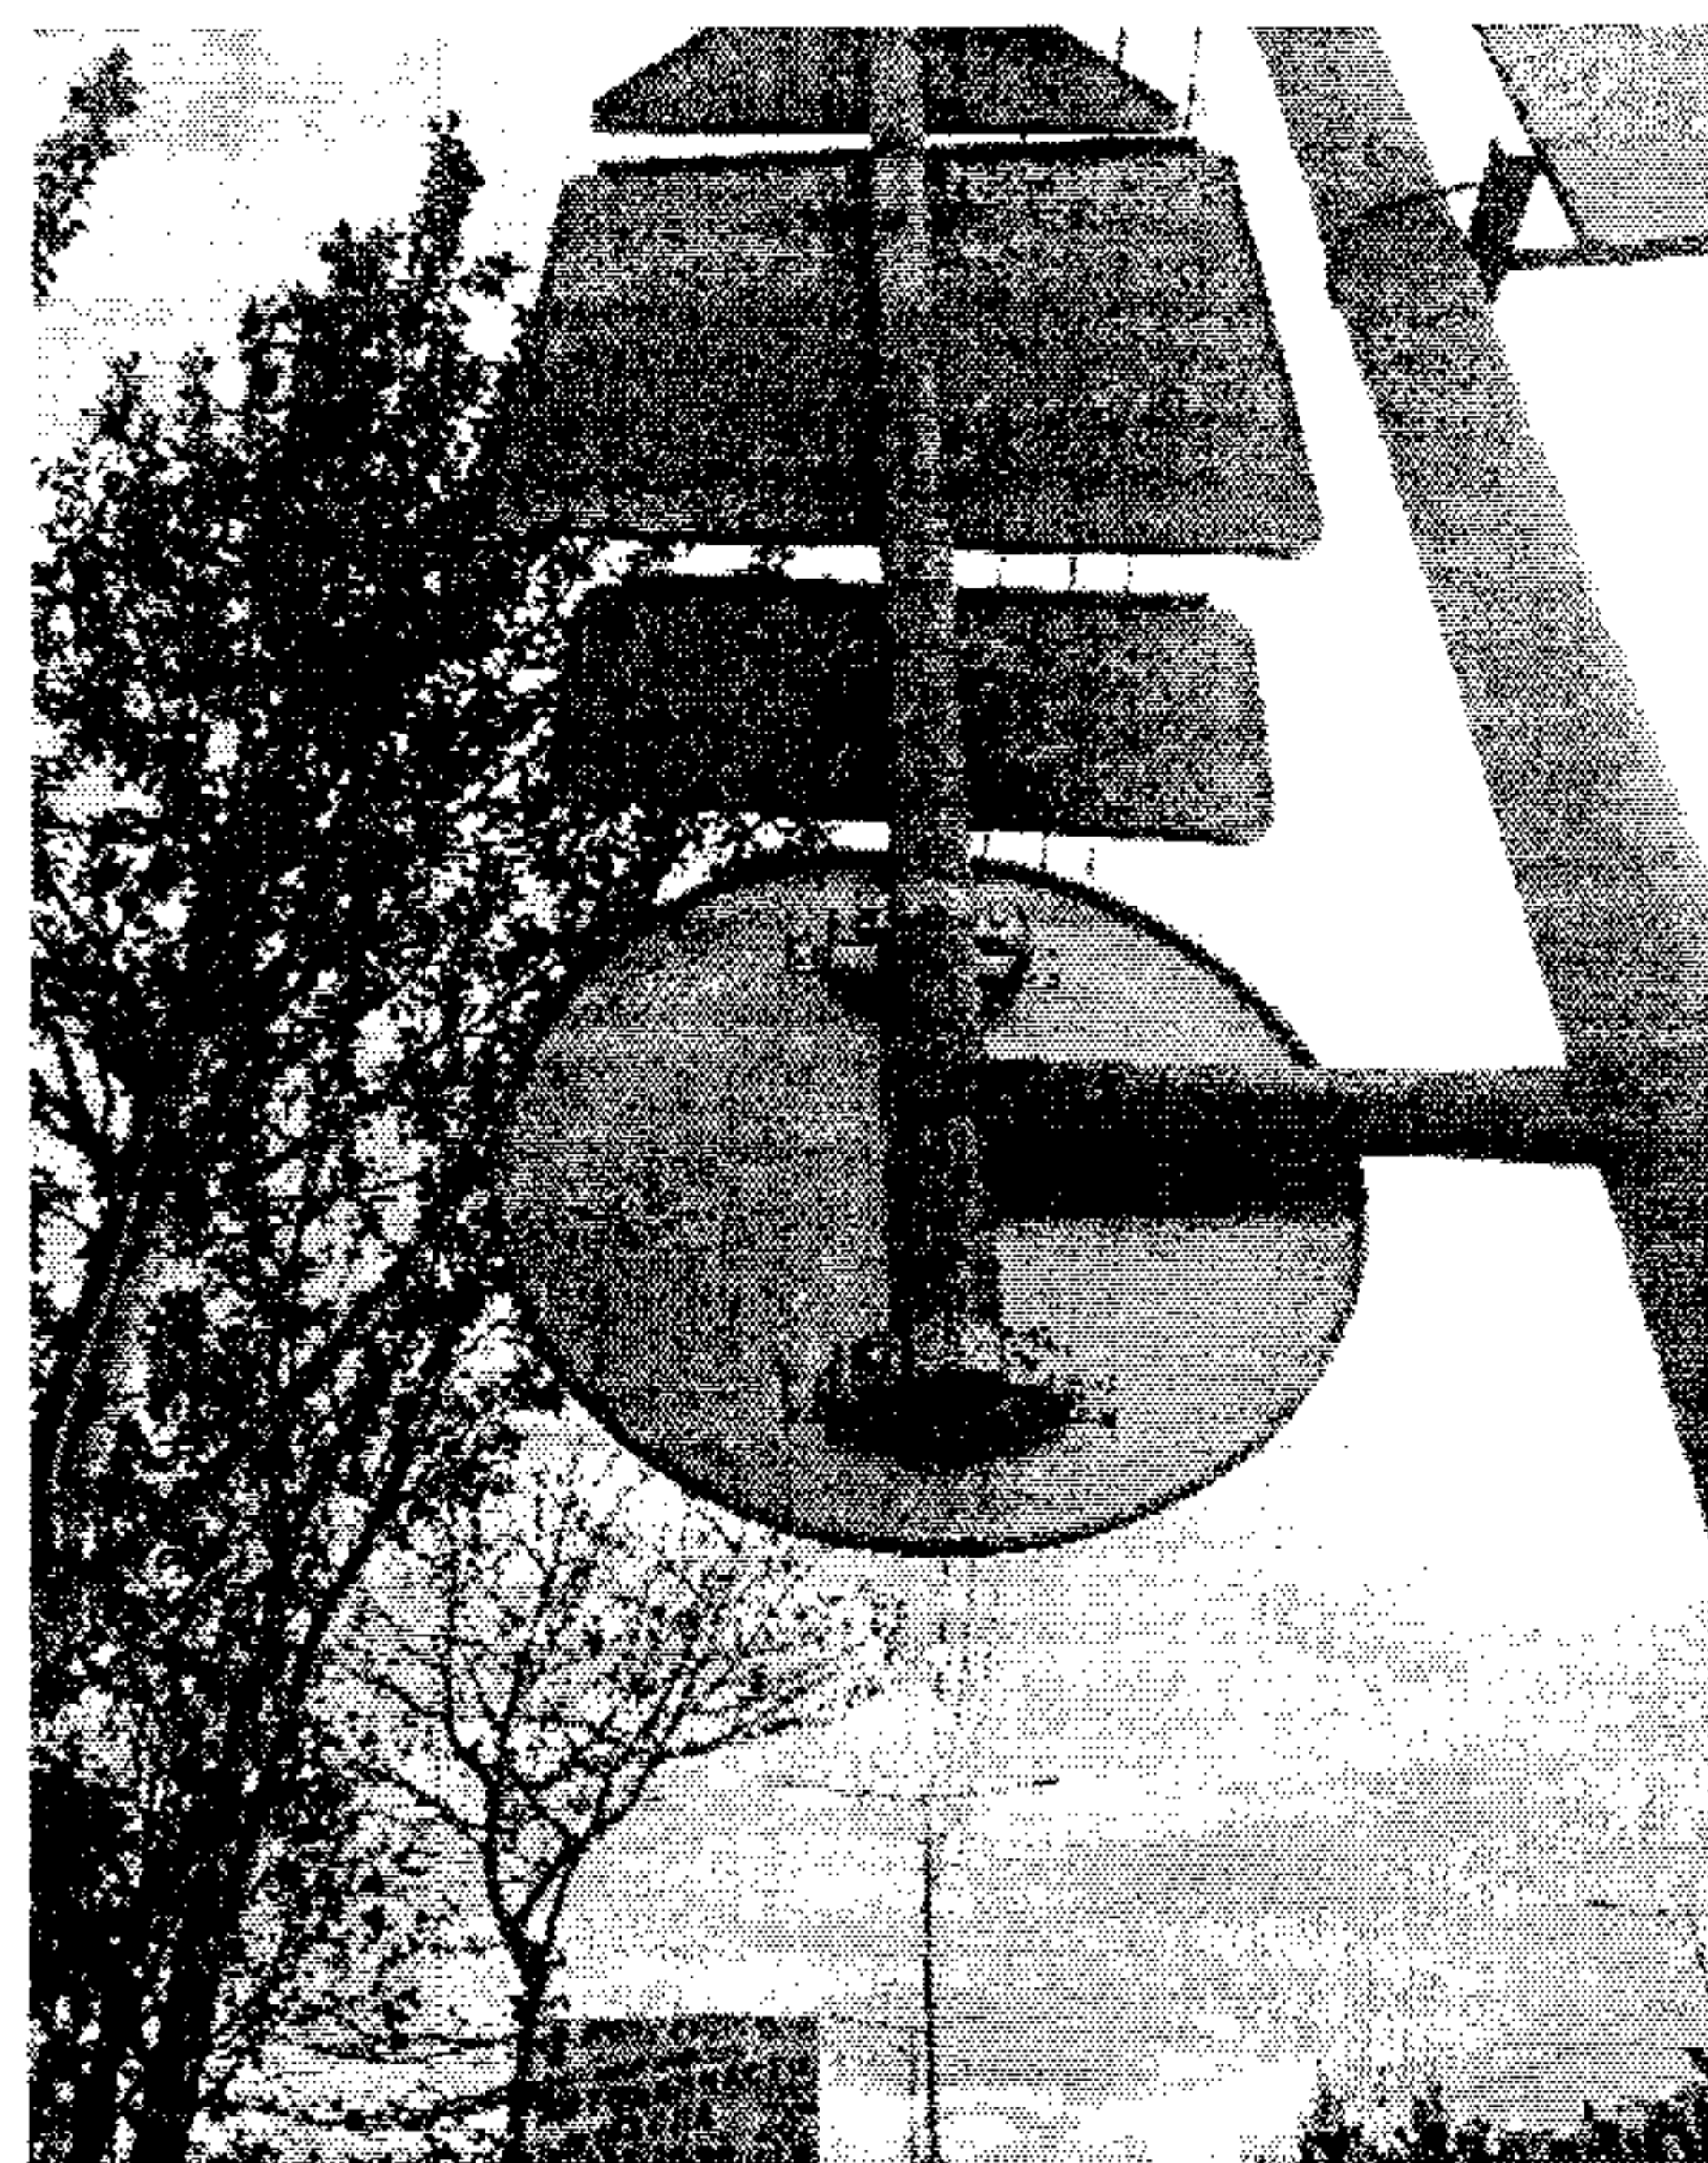


Фото № 6

- выправка положения дорожного знака, замена стойки, замена дорожных знаков тип 5.19.1, 5.19.2 по адресу: сооружение автомобильная дорога ул. Автомобилистов (Фото №№ 7,8);



Фото № 7

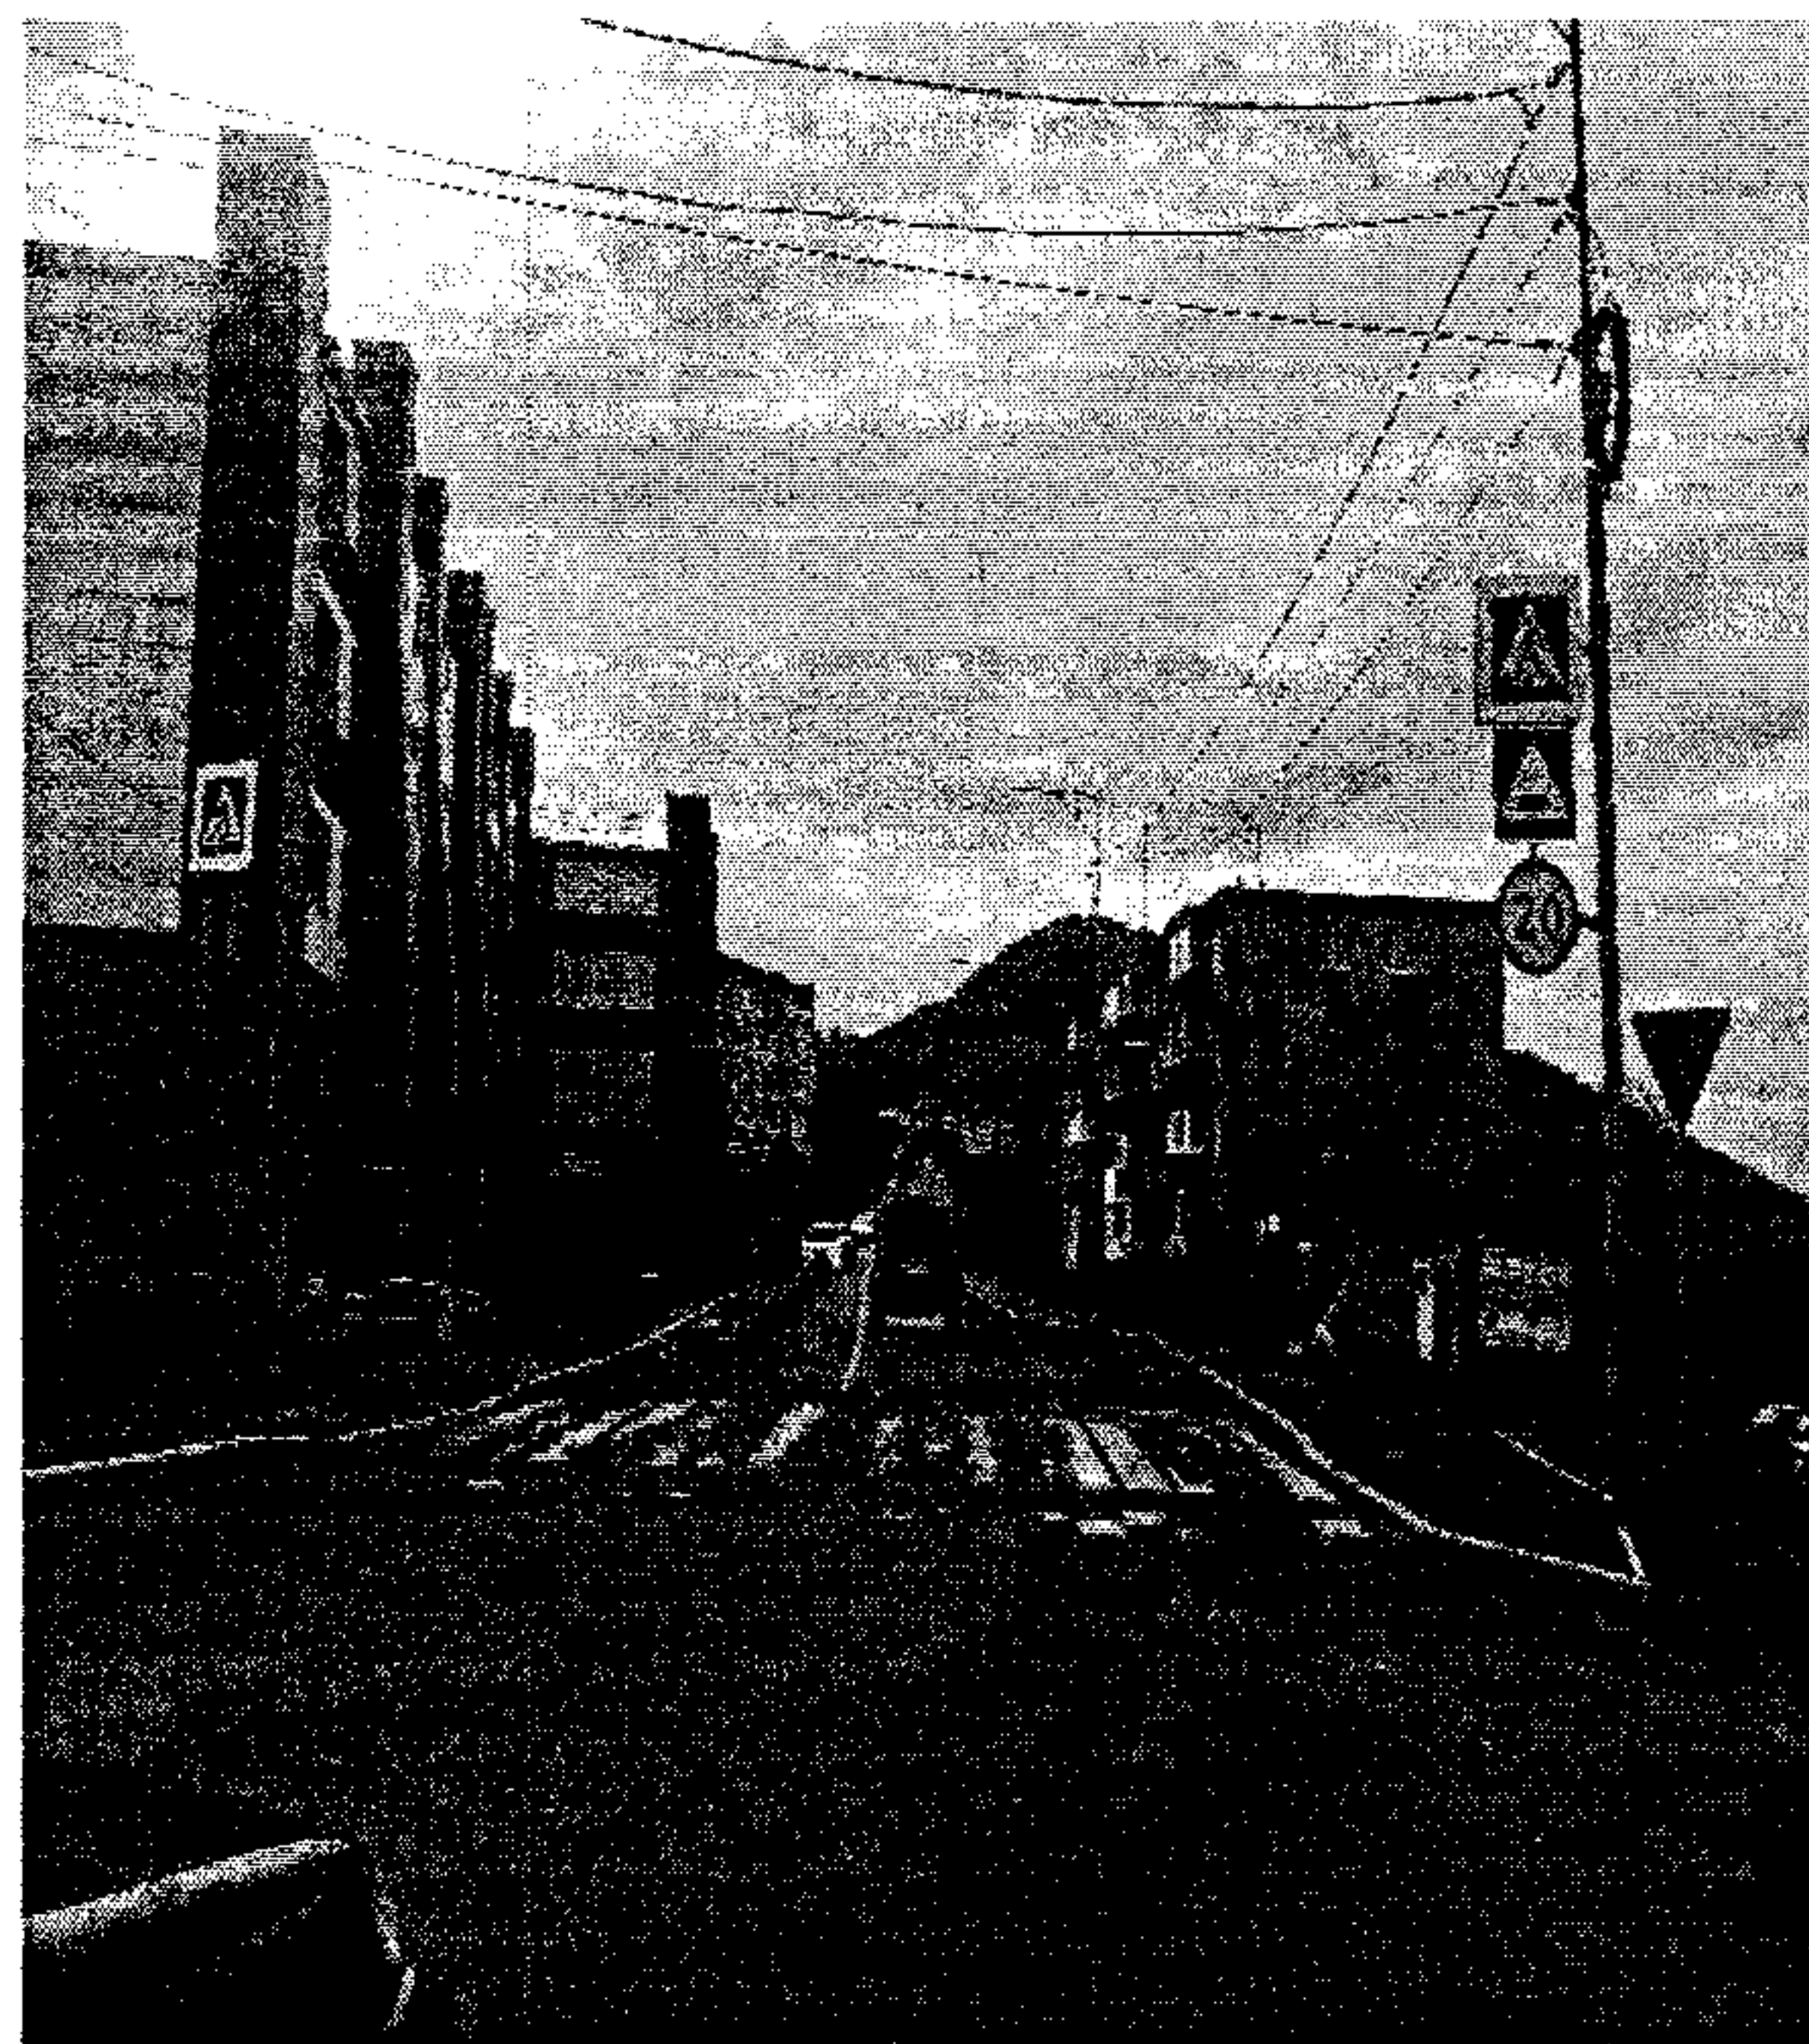


Фото № 8

- замена транспортного светофора Т1.2 с ремонтом выноса над проезжей частью 7 м, выправка положения дорожного знака, диагностика светофорного объекта по адресу: светофорный объект «ул. Тушканова-областная библиотека»-перекресток Сооружение автомобильная дорога по ул. Тушканова – сооружение автомобильная дорога ул. Топоркова от пересечения с ул. Тушканова до жилых домов по ул. Топоркова – Автомобильная дорога районного значения от ул. Тушканова до пр. К. Маркса (Фото №№ 9,10).



Фото № 9



Фото № 10

Визуальным осмотром установлено, что все дорожные знаки установлены и выправлены, транспортный светофор Т1.2 заменен и находится в рабочем состоянии.

4. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) установленных мероприятию

Исполнение основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы за 2024 год составило 138 755 225,02 рублей, или 95,75% от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Приняты бюджетные обязательства МКУ «САД» в 2024 году на сумму 140 724 625,33 рублей согласно Уведомлениям о бюджетных назначениях на 2024 год (2024 год и плановый период 2025-2026 годов) от 27.11.2023 № 27, от 02.01.2024 №№ 82, 83, от 02.02.2024 №№ 190, 194, от 26.04.2024 № 425, от 27.06.2024 № 534, от 05.08.2024 №№ 653, 654, от 04.09.2024 № 751, от 23.09.2024 № 800, от 31.10.2024 № 900, от 27.12.2024 №№ 1180, 1182.

Согласно муниципальной программы единственным исполнителем основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы является Учреждение.

В рамках исполнения основного мероприятия в 2024 году осуществлялись следующие подмероприятия⁶⁰:

- мероприятие по модернизации, дооснащению и ремонту технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании – исполнение составило 2 189 766,75 рублей или 47,13% от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- подмероприятие по содержанию технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов – исполнение составило 12 911 440,46 рублей или 96,32% от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- подмероприятие по обустройству автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки) – исполнение составило 3 110 562,66 рублей или 98,73% от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- подмероприятие по нанесению дорожной разметки (краской, пластиком) – исполнение составило 120 543 455,15 рублей или 99,83% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы и фактическое исполнение в 2024 году представлены в таблице 2:

Таблица 2

Наименование целевых показателей (индикаторов)	Ед. измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)		Факт за 2024 год по данным сводного отчета о реализации муниципальных программ ПКГО за 2024 год	Факт за 2024 год по данным Учреждения ⁶¹
		базовые	2024		
1	2	3	4	5	6
Количество модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения	штук	2	14	14	45

⁶⁰ Согласно сводному отчету о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 2024 год.

⁶¹ Информация предоставлена Учреждением 18.09.2025 (исх. от 18.09.2025 № 5023/25) на электронную почту Контрольно-счетной палаты, в рамках ответа на запрос КСП ПКГО исх. 17.09.2025 № б/н.

Доля модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения от их общего количества	процент	100	31,1	31,1	100
Количество светофорных объектов, подлежащих содержанию	штук	45	45	45	45
Количество установленных (замененных) дорожных знаков	штук	71	314	314	311
Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком	квадратный метр	11 992	14 639	14 639	25 724

Как видно из таблицы, представленные данные Учреждения по целевым показателям «Количество модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения», «Доля модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения от их общего количества», «Количество установленных (замененных) дорожных знаков», «Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком» отличаются от целевых показателей, указанных в сводном отчете о реализации муниципальных программ ПКГО за 2024 год, а именно:

- по показателю «Количество модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения»: согласно данным Учреждения количество отремонтированных технических средств организации дорожного движения (штук) – 45 штук, что на 31 штуку больше, чем указано в сводном отчете о реализации муниципальных программ ПКГО за 2024 год;

- по показателю «Доля модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения от их общего количества»: согласно данным Учреждения доля отремонтированных технических средств организации дорожного движения от их общего количества (процент) – 100%, что больше на 68,9%, чем указано в сводном отчете о реализации муниципальных программ ПКГО за 2024 год;

- по показателю «Количество установленных (замененных) дорожных знаков»: согласно данным Учреждения количество установленных (замененных) дорожных знаков (штук) – 311 штук, что на 3 штуки меньше, чем указано в сводном отчете о реализации муниципальных программ ПКГО за 2024 год;

- по показателю «Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком»: согласно данным Учреждения площадь нанесенной дорожной разметки пластиком (квадратный метр) – 25 724, что на 11 085 квадратных метров больше, чем указано в сводном отчете о реализации муниципальных программ ПКГО за 2024 год.

Таким образом, согласно данным Учреждения один целевой показатель (индикатор) «Количество установленных (замененных) дорожных знаков» не достигнут, а три целевых показателя (индикатора) перевыполнены.

Выводы:

1. В целях соблюдения требований части 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в Учреждении создана контрактная служба и утверждено Положение (регламент) о контрактной службе от 20.08.2025, которое соответствует требованиям Приказа № 158н.

2. Заказчиком претензионная работа за невыполнение в срок Контракта № 212, не осуществлялась.

3. По итогам анализа Договоров №№ 27/04/2025, 30/05/2025, 31/05/2025, 32/05/2025 установлено, что заключенные Договоры №№ 27/04/2025, 30/05/2025, 31/05/2025, 32/05/2025 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ.

4. Контракт № 240 заключен в нарушение требований Закона № 44-ФЗ, а именно применен некорректный метод обоснования НМЦК.

5. Учреждение заключило дополнительное соглашение к Контракту № 998 в отсутствие документов (акта обследования, дефектовочного акта и т.д.) подтверждающих необходимость проведения дополнительного обслуживания светофорных объектов и контроллеров, а лишь на основании письма Подрядчика от 02.10.2023 № б/н. Данные действия Заказчика согласно статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются неэффективным использованием бюджетных средств городского округа в размере 549 066,44 рублей.

6. Визуальным осмотром выполненных работ по Договору от 25.04.2024 № 26/04/2024 установлено, что дорожное зеркало установлено и находится в рабочем состоянии, вместе с тем в настоящее время дорожное зеркало повреждено в двух местах – присутствуют трещины.

7. Визуальным осмотром выполненных работ по Договору от 26.03.2025 № 21/03/2025 установлено, что работы по содержанию технических средств регулирования дорожного движения в г. Петропавловске-Камчатском выполнены в полном объеме.

8. Информация, указанная в сводном отчете о реализации муниципальных программ ПКГО за 2024 год по исполнению целевых показателей (индикаторов) основного мероприятия отличается от информации представленной Учреждением. Так, согласно данным Учреждения один целевой показатель (индикатор) «Количество установленных (замененных) дорожных знаков» не достигнут, а три целевых показателя (индикатора) перевыполнены.

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить для сведения:
- в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Направить информационное письмо в Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению

и предупреждению нарушений.

3. Направить информационное письмо в адрес Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в целях устранения нарушений в отчетах и предупреждения выявленных нарушений в подведомственных Управлению учреждениях.

4. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю о наличии признаков состава административных правонарушений.

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор



В.В. Глухов

Отчет утвержден 31.10.2025 (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2025 № 12).
